Beilage: 3.3

Instruktionsverfahren für Kanalisationsarbeiten

Bezeichnung der Maßnahme:
Poststraße Kanalerschließung

Erläuterung der Baumaßnahme:
Kanalneubau von 679m Regenwasserkanal DN 1400 und von 475m Schmutzwasserkanal DN400 in offener Bauweise

Voraussichtliche Bauzeit:	Katasterblatt-Nr.:
Mai 2007 bis **Mai 2008**	**308; 309**

Vorgenannte Kanalbaumaßnahme soll nach beiliegendem Planeintrag durchgeführt werden.
Um Rückgabe der Instruktionsunterlagen bis **08.08.2006** wird gebeten.

I. Je an:

Geo	zur Eintragung der Eigentumsverhältnisse	1 Plan
VpI	zur Stellungnahme und Eintragung der zukünftigen Planung einschließlich Straßenhöhen	1 Plan
StpI	zur Stellungnahme	1 Plan
LA	zur Stellungnahme	1 Plan
T/1	zur Stellungnahme	1 Plan
VAG	zur Stellungnahme und Eintragung der vorhandenen und geplanten Versorgungsleitungen einschl. Leitungen Dritter	1 Plan
T/Z-K	zur Stellungnahme und Eintragung der vorhandenen Privatleitungen und im Besonderen zur Stellungnahme, ob **Altlasten** zu erwarten sind	4 Pläne
FW	zur Stellungnahme und Eintragung der vorhandenen und geplanten Versorgungsleitungen einschl. Leitungen Dritter	1 Plan
OA/5	zur Stellungnahme aus Gesichtspunkten des Katastrophenschutzes und im Besonderen zu möglichen **Kampfmittelfunden** unter Auswertung des vorliegenden Luftbildmaterials und sonstiger Unterlagen einschl. einer verbindlichen und konkreten Empfehlung für die Kampfmittelsuche	1 Plan
HDS	zur Stellungnahme	1 Plan
GBA	zur Stellungnahme	2 Pläne
UwA	zur Begutachtung unter Umweltgesichtspunkten	3 Pläne
SUN/S-1/3	zur Kenntnis	2 Pläne

I. UwA 12 v.E. 12.07.06 i.A.
II. UwA 3 Siehe bes. UwA/S Stellg. vom 18.07.06

12. JULI 2006

Abt.	z. w. V.
	z. Stellungnahme
	z. Vorlage der Antwort

II. SUN/S-1/2

Nürnberg, den 11.07.2006
Stadtentwässerung und
Umweltanalytik Nürnberg
Abwasserableitung
Sachgebiet Kanalbau
i.A.

Schramm
(4588)

III. UwA/5 v.E. 12/07/06 i.A.
IV SUN/S-1/3 erledigt

Stand: Juni. 2006

Betreff:	**Poststraße Kanalerschließung**
	Kanalneubau von 679 m Regenwasserkanal DN 1400 und von 475 m Schmutzwasserkanal DN 400 in offener Bauweise
Bezug:	Instruktion von SUN/S-1/2 vom 11.07.2006
Anlage:	- Formblatt zum Baumschutz

I. Seitens der Unteren Naturschutzbehörde bestehen gegen die Durchführung der o.g. Maßnahme keine Bedenken, sofern die DIN 18920 und das als Anlage beigelegte Formblatt beachtet werden.
Sollte in geschützte Bäume sowie in den Schutzbereich (Kronentraufenbereich + 1,5 m) i. S. der BaumSchVO eingegriffen werden und sich diese auf Privatflächen befinden, ist die Untere Naturschutzbehörde unter Telefon 231 - 5859 einzuschalten.
Für die durch die Baumaßnahme betroffenen Straßenbäume oder Bäume in öffentlichen Grünflächen ist eine Stellungnahme von GBA einzuholen.

Zusätzliche Auflagen / Hinweise:

der vorhandene Gehölzbestand entlang der Poststraße ist bei den Kanalbauarbeiten vor jeglichen Beeinträchtigungen zu bewahren.

II. SUN/S-1/2

Am 18.07.2006
Umweltamt/3-1
i. A.


Bierlein (5859)

I:\uwa3\Instruktionen 2006\Poststraße_Kanalerschließung_SUN-Instruktion_vom_11.07.2006.doc


Baumschutz auf Baustellen

AUTOR: ARBEITSKREIS STADTBÄUME, GARTENAMTSLEITERKONFERENZ IM DEUTSCHEN STÄDTETAG


NOVEMBER 2001

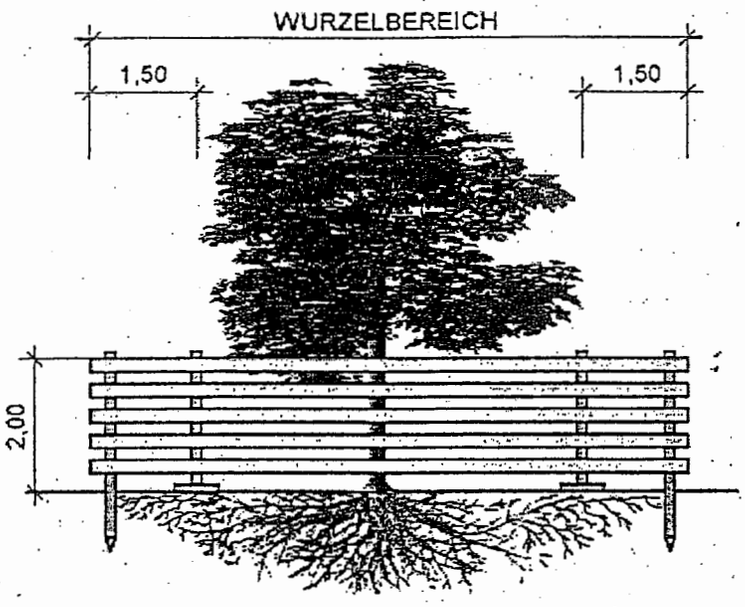


WURZELSCHUTZ
DURCH ZAUN

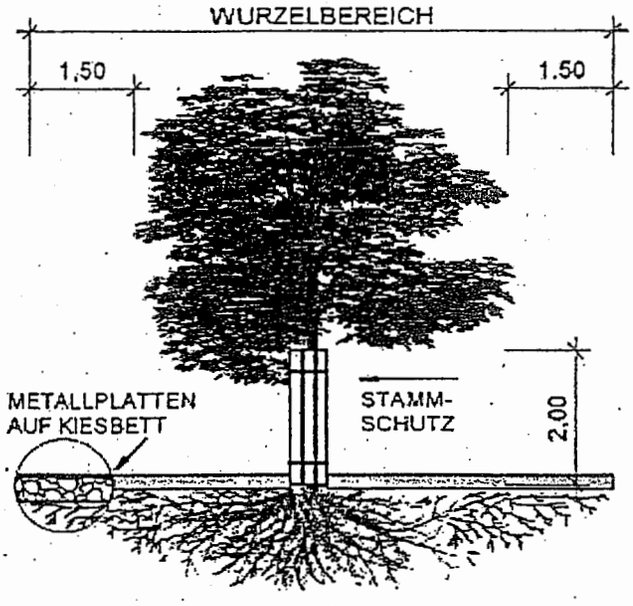

WURZELSCHUTZ
DURCH LASTVERTEILUNG

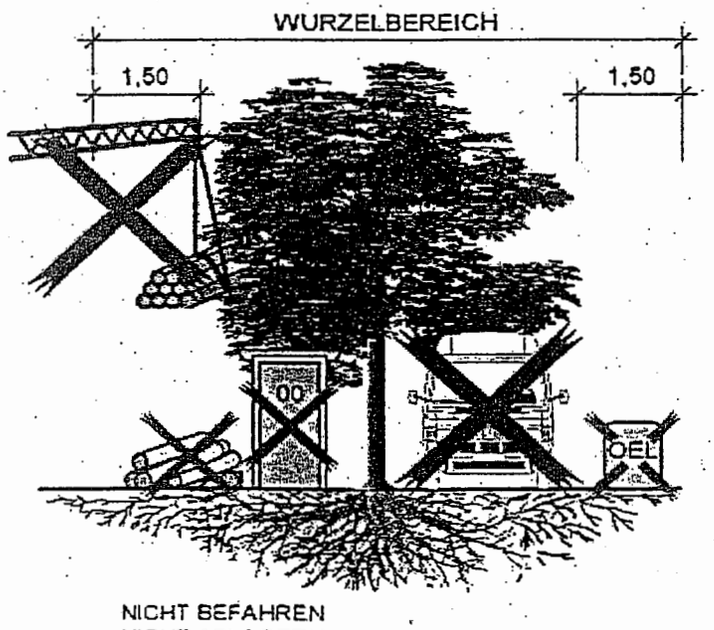

NICHT BEFAHREN
NICHT ABLAGERN:
- TREIBSTOFFE, CHEMIKALIEN
- BAUMATERIALIEN
- BAUSTELLENEINRICHTUNG
SCHWENKBEREICH BEACHTEN

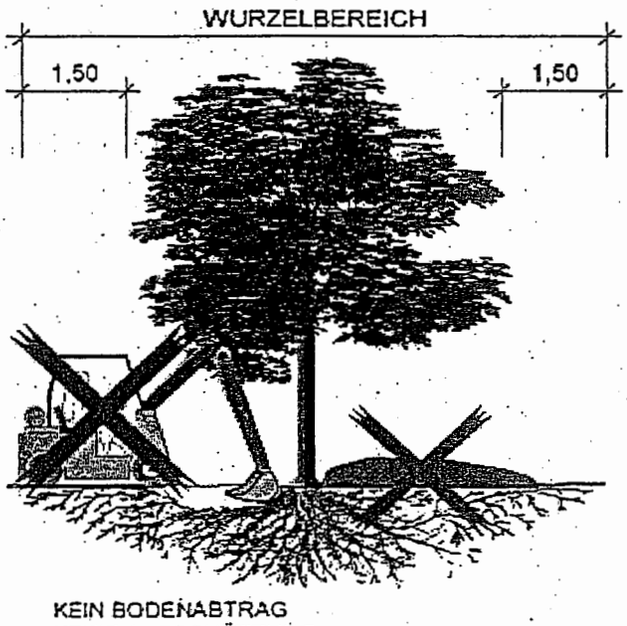

KEIN BODENABTRAG
KEINE AUFSCHÜTTUNG
NICHT VERDICHTEN
KEINE LEITUNGSVERLEGUNG!
KRONE SCHÜTZEN

WICHTIG:
DIN 18920
RAS -LP4

Baumschutzverordnung

gespeichert unter:
Vorlagen UwA/3: - 1Baumschutz-Baustelle.dot

Information:
Stadt Nürnberg
Umweltamt/3
Lina-Ammon-Straße 28
90317 Nürnberg
